
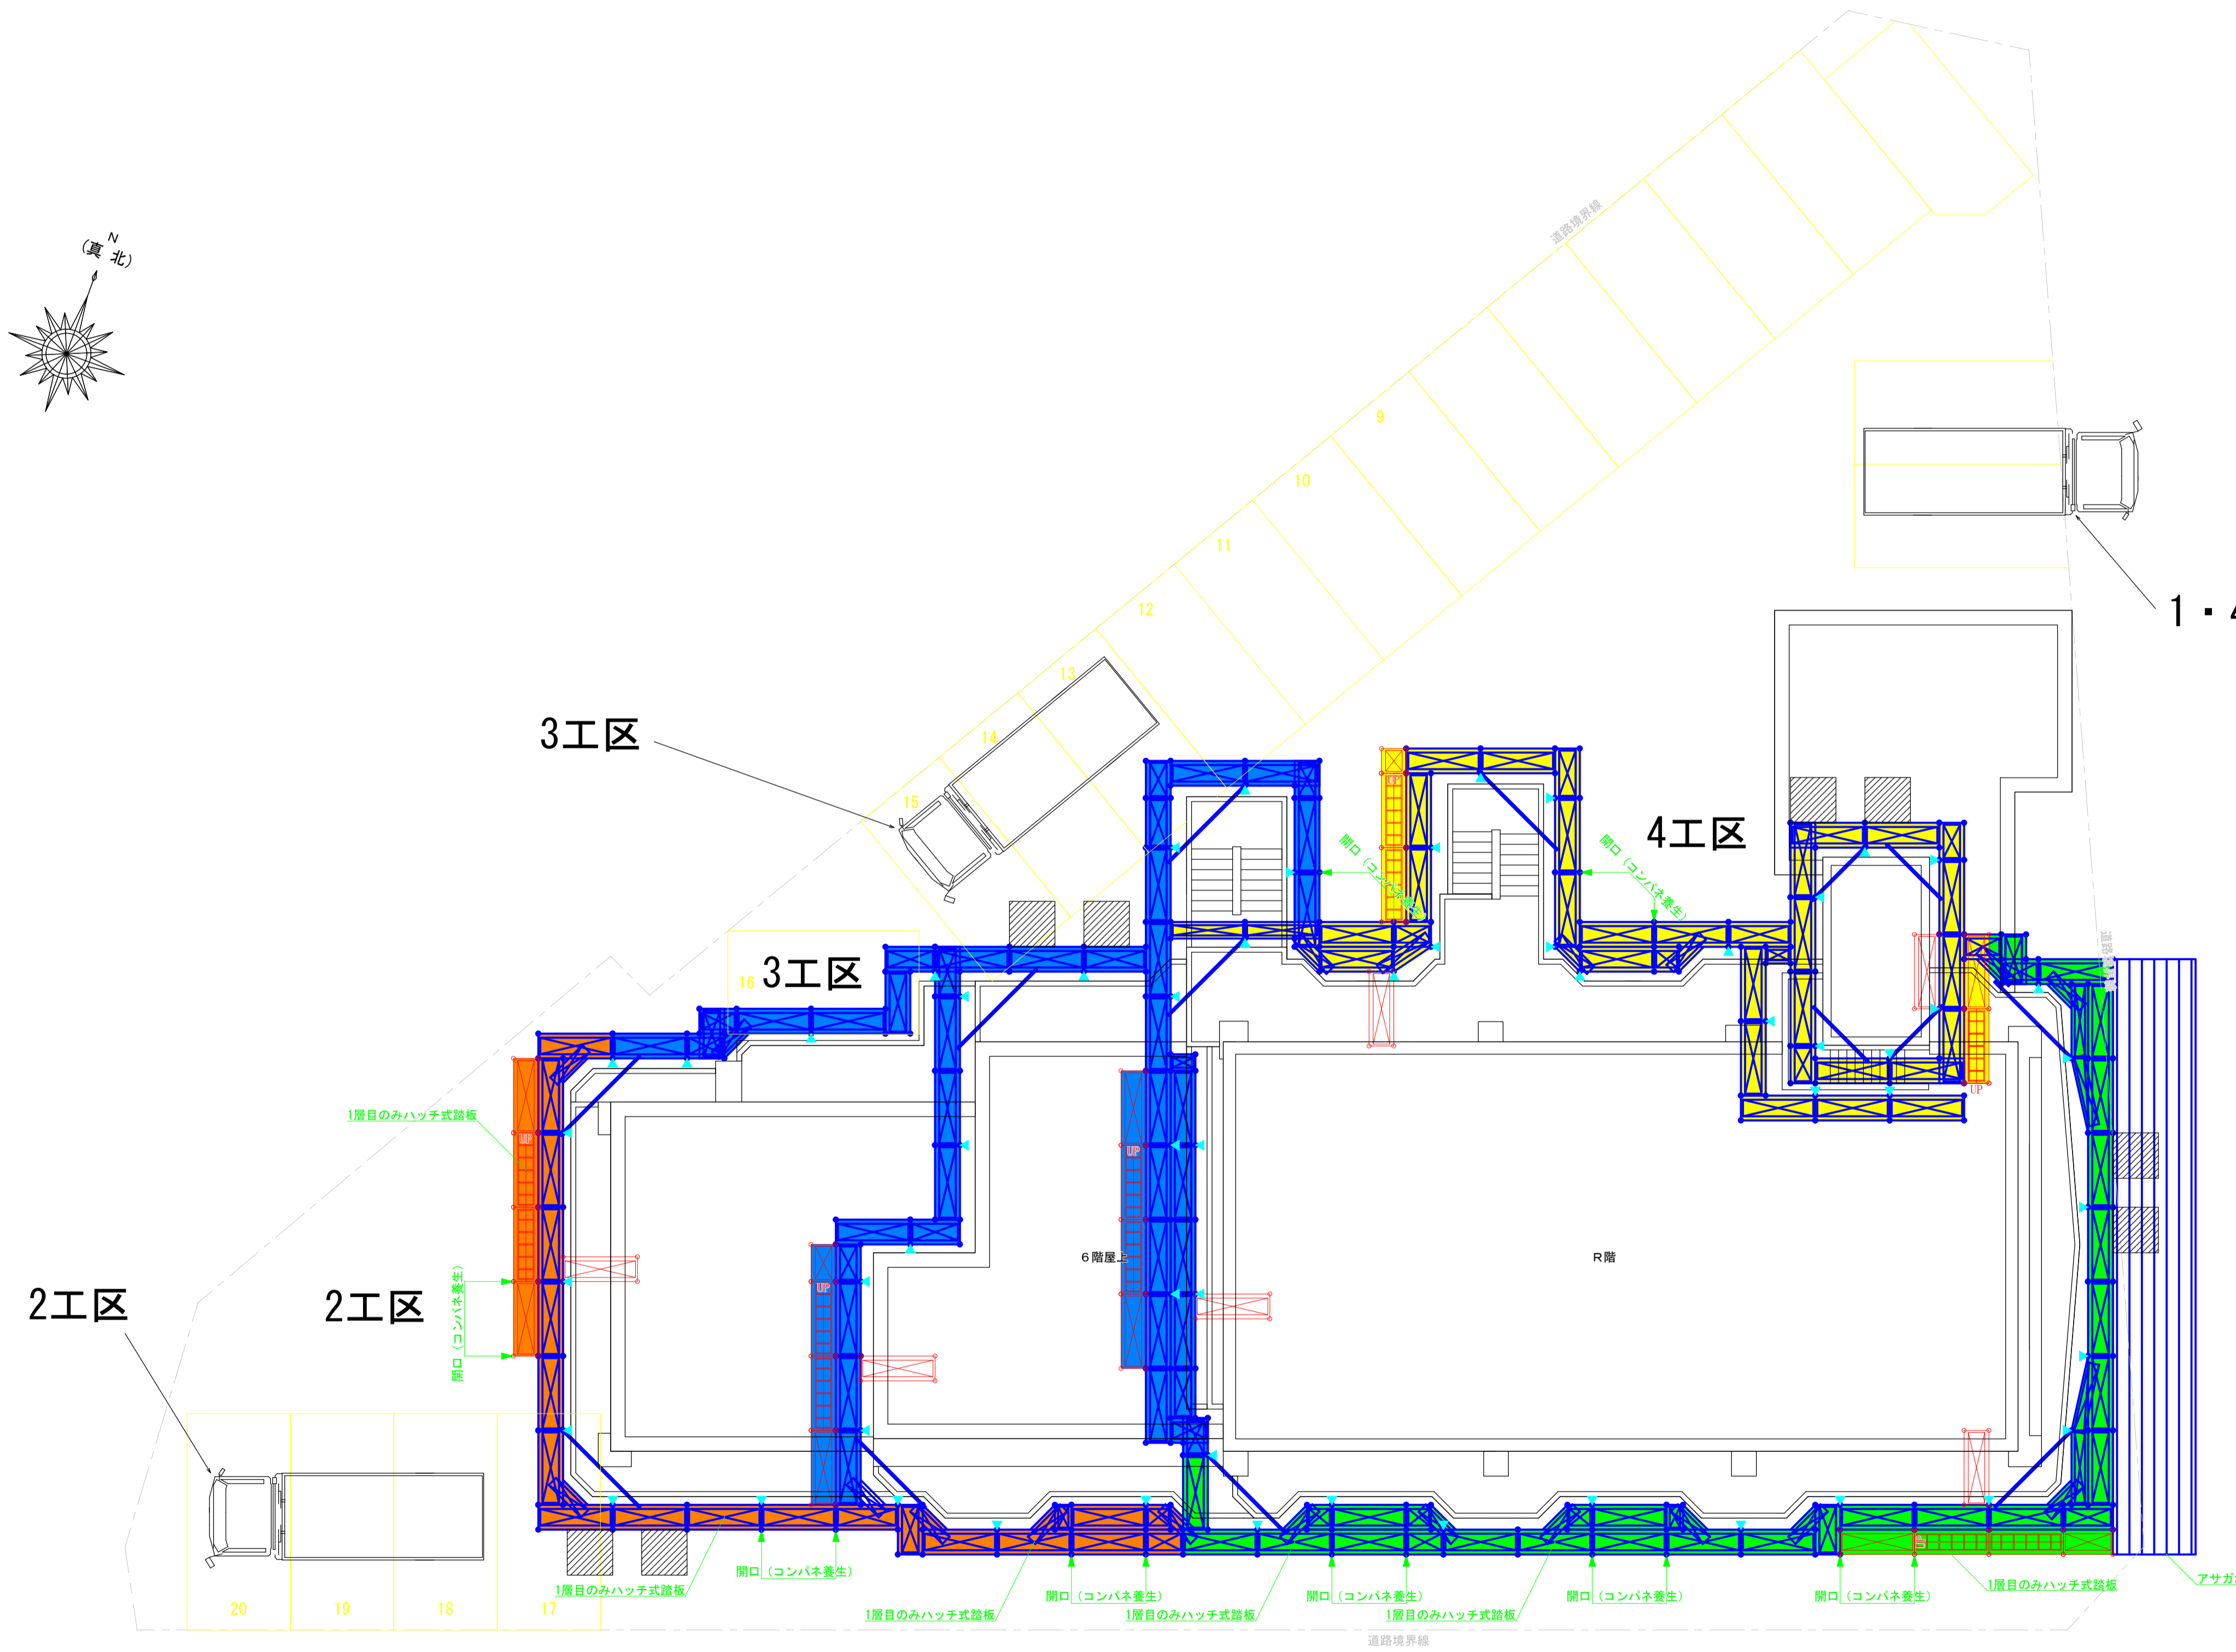


〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇大規模改修工事 足場工程

住所：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



足場工程	
1工区	7日～7.5日間
2工区	3日～3.5日間
3工区	3.5日～4日間
4工区	7日～7.5日間
合計	20.5日～22.5日間日間

※雨天・作業人数により多少の変更が考えられます。
 ※足場材荷揚げ用EVを使用する為発電機の騒音が発生いたします。
 ※作業人数・トラック台数は前日お昼までに連絡致します
 ※日曜・祝日は含まれておりません。

- 注意事項
- ※親綱・フルハーネス使用
 - ※作業以外の私語禁止
 - ※作業時間 8時30分～17時迄
 - ※場内禁煙
 - ※足場部材・安全帯は第三者の妨げにならない場所に置く
 - ※弁当等のごみは必ず持ち帰る事
 - ※足場施工は工区毎に仕上げていくこと
 - ※落下防止完全着用
 - ※シート足場1段or3段毎施工

